

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف	مكتب رمك للاستشارات الهندسية
	اداره تنفيذ الطرق	
☒ تقديم جديد	مشروع تلال الغروب	
☐ اعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي : الامير فواز
رقم المخطط : BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 01 عرض الشارع : 18
استلام الطبقة : BOTTOM SUBBASE1 الى محطة رقم : 264.25+0
125+0

اعمال اخرى : ☐

توقيع مهندس الموقع : التاريخ : 28/9/2024
المراقب ☐ المساح ☐ المختبر ☐ توقيع المهندس المشرف :

مرئيات المراقبة : ☒ جاهز
☐ غير جاهز
ملاحظات :

نتيجة تدقيق المساحة :
من المحطة : 125+0 الى المحطة : 264.25+0
من المحطة : الى المحطة :
مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري ☐
متطابق ☒
غير متطابق ☐
ملاحظات :
التوقيع : التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :
توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد :
تصنيف المواد ☐ مرفق ☐ قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :
غير مرفق ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

النتيجة : ☐ ناجح ☐ راسب ☐ التوقيع : التاريخ : / /

ملاحظات
تعليمات المهندس الاستشاري :
☐ موافق ☐ غير موافق
التوقيع :
رئيس قسم نتائج الدراسات للملك

تم الاستلام : مندوب المقاول : التوقيع : التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للبنات : مدير المشاريع : 0544714479 : 0566152766 : 0544714479 : 0566152766 : 0544714479 : 0566152766

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتشغيل والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية			
تقرير إستلام طبقة ردم											
اسم المشروع :-		تلال الغروب		رقم المخطط :-		BLOCK03		رقم الشارع :-		ROAD-B03-1	
رقم الطبقة :-		BOUOTTOM OF SUBBASE1		عرض الشارع :-		264.26M		طول الشارع :-		18	
LAYAER THICKNESS		0.150		WIDHT-R		9.000		WIDHT-L		9.000	
DEOTH FROM TOP SUB.G		0.000									
PVI	Station	Easting	Northing	L	C.L	R	CL width from L	CL width from R			
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%			
				-5.500	-3.500	0.000	3.500	5.500			
11	125	530246.579	2369417.943	59.043	59.095	59.043	59.125	9.000	9.000		
12	137.5	530258.12	2369413.141	59.136	59.188	59.136	59.218	9.000	9.000		
13	150	530269.66	2369408.339	59.229	59.281	59.229	59.311	9.000	9.000		
14	162.5	530281.201	2369403.537	59.322	59.374	59.322	59.404	9.000	9.000		
15	175	530292.742	2369398.735	59.414	59.466	59.414	59.496	9.000	9.000		
16	187.5	530304.283	2369393.933	59.507	59.559	59.507	59.589	9.000	9.000		
17	200	530315.824	2369389.131	59.600	59.652	59.600	59.682	9.000	9.000		
18	212.5	530327.364	2369384.329	59.693	59.745	59.693	59.775	9.000	9.000		
19	225	530338.905	2369379.527	59.781	59.833	59.781	59.863	9.000	9.000		
20	237.5	530350.446	2369374.725	59.847	59.899	59.847	59.929	9.000	9.000		
21	250	530361.987	2369369.923	59.888	59.940	59.888	59.970	9.000	9.000		
22	262.5	530373.528	2369365.121	59.906	59.958	59.906	59.988	9.000	9.000		
23	264.26	530375.153	2369364.445	59.908	59.960	59.908	59.990	9.000	9.000		
الإستشاري				المقاول							
مكتب رمك للإستشارات الهندسية				شركة طرق الرياض للمقاولات							
الإسم :- م/ قاضل محمد				الإسم :-							
التوقيع :-				التوقيع :-							
التاريخ :-				التاريخ :-							

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.55
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	29/09/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلأل الغروب	Sample By	Hossam
Test Apparatus	WINTESTING EDG-WS	Ref.	ASTM D 7698

Layer	1st layer of Sub Base
Location	Block 03 Street 01 Sta. 125 to Sta. 264

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m3	kg/m3	%	%	%
1	0+130	2.415	2.257	7.0	100.7	
2	0+175	2.394	2.229	7.4	99.5	
3	0+190	2.400	2.237	7.3	99.8	
4	0+210	2.355	2.179	8.1	97.2	
5	0+220	2.385	2.223	7.3	99.2	
6	0+250	2.452	2.275	7.8	101.5	

M.D.D = 2.241 kg/m3
O.M.C = 6.48 %

The lab is responsible of all information provided in this report , unless this information is given by the client.

* These results are for the tested materials and tested locations only.


The lab is not responsible of sampling. sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Choked by

Approved by



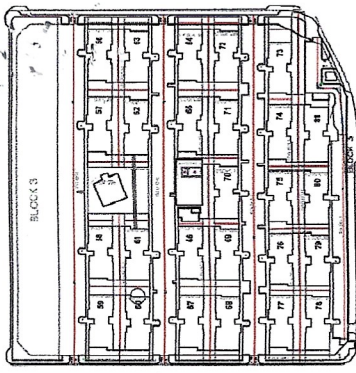

اتجاه تصريف المياه
الارض الطبيعية
الخط التصميمي
اسفلت قائم
المسكة المروية المموهية
إمالة مدينة جدة
جدران حديدية وخرق
أرصفة الخرسانة

المالك / وزارة السكان

المطور / شركة مدني العامرية

الاستشاري / الشركة العامة للمهندسين

المستشار / مكتب روك لا استشارات الهندسية

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات

تصميم الطرق لمشروع تلال الغرب
بحسب الامير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مقياس الرسم: 1:350
NO. 3 GENERAL LAYOUT PLAN

مدني عامرية لتصميم الطرق
مدرسة الدراسات والتصميم

مدير المشروع /

مدير التصميم /

مدير التنفيذ /

مدير المراجعة /

مدير الإشراف /

مدير المراجعة /

